


[panorapresse.ouest-france.fr](https://panorapresse.ouest-france.fr)

## Travaux au collège Prévert, premiers points d'étape

2-3 minutes

### Travaux au collège Jacques-Prévert de Coutances : quels sont les premiers points d'étape du chantier ?

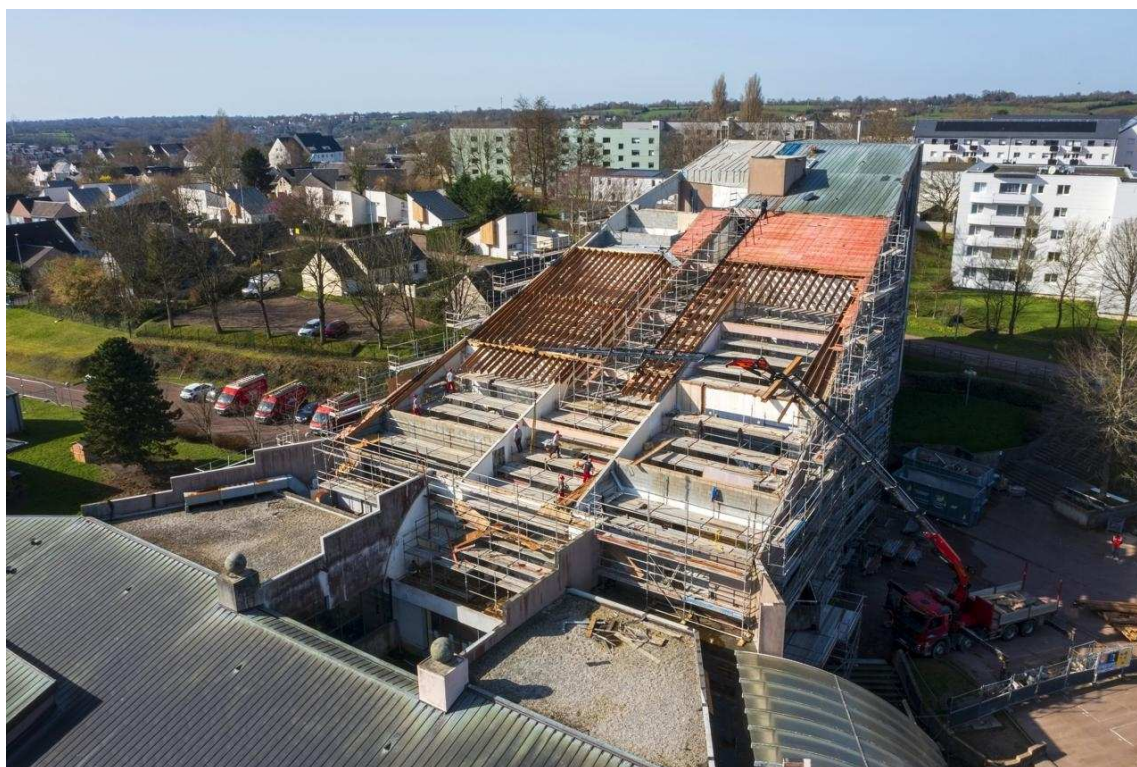

Au collège Jacques-Prévert de Coutances ([Manche](#)), le chantier a débuté par la dépose de la charpente. | DDaguierCD50

Endommagé par le passage de la tempête Ciaran en 2023, le collège Jacques-Prévert de Coutances ([Manche](#)) fait l'objet de travaux de reconstruction et de rénovation énergétique depuis janvier 2026. Le département a dressé vendredi 27 février un premier point d'étape sur les interventions en cours et celles à venir.

Après le passage de la tempête Ciaran en novembre 2023, le collège Jacques-Prévert de Coutances ([Manche](#)) avait subi d'importants dégâts. En janvier 2026, [les travaux de restauration et de rénovation énergétique](#), estimés pour une durée d'un an, ont débuté. Ce vendredi 27 février, le Département de la [Manche](#) a présenté des précisions sur le calendrier.

Pour la rentrée scolaire, le collège Prévert de Coutances « associe les élèves à tous les projets »

#### La dépose de la charpente

Première étape : la dépose de la charpente sur la moitié du bâtiment, malgré une interruption due à la météo et un retard de «deux semaines environ».

L'entreprise de maçonnerie interviendra à partir du 9 mars afin de réaliser les sommiers destinés à accueillir la future charpente. Un mois minimum sera nécessaire pour cette intervention, avant la poursuite des travaux avec l'installation de la nouvelle charpente et la pose des menuiseries, prévues à la mi-avril 2026.

Le calendrier prévisionnel se poursuivra en mai 2026 avec la mise en place de la nouvelle couverture. Fin juin 2026, les travaux concerneront l'aile sud. Le dernier volet du chantier s'étendra de septembre 2026 à mars 2027, avec la rénovation de l'aile ouest. Ces prévisions restent toutefois indicatives, la météo pouvant modifier le calendrier établi.

Naomi Vastel
